ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - Revitalizace kláštera a klášterní zahrady**	**472 dny**	**15.8. 13**	**30.11. 14**
2	Podpis SOD	0 dny	15.8. 13	15.8. 13
3	Převzetí staveniště, stavebního povolení a územního povolení s vyjádřeními DOSS	0 dny	15.8. 13	15.8. 13
4	Zahájení prací	0 dny	15.8. 13	15.8. 13
5	Vybudování ZS	20 dny	15.8. 13	4.9. 13
6	**Klášter**	**457 dny**	**15.8. 13**	**15.11. 14**
7	**SO 01 Klášter**	**457 dny**	**15.8. 13**	**15.11. 14**
8	Přípravné práce	5 dny	4.9. 13	9.9. 13
9	**Restaurátorské práce**	**440 dny**	**15.8. 13**	**29.10. 14**
10	Zpracování a odsouhlasení restaurátorského záměru	230 dny	15.8. 13	2.4. 14
11	Závazný uzlový bod č.6 Zahájení restaurátorských prací dle restaurátorského záměru	0 dny	2.4. 14	2.4. 14
12	Restaurátorské práce	210 dny	2.4. 14	29.10. 14
13	Závazný uzlový bod č.8 Dokončení restaurátorských prací	0 dny	29.10. 14	29.10. 14
14	**Stavební práce klášter**	**432 dny**	**9.9. 13**	**15.11. 14**
15	Zemní práce	15 dny	9.9. 13	24.9. 13
16	Poskytnutí místnosti pro uchování [illegible]	0 dny	15.9. 13	15.9. 13
17	Přestěhování mumie investorem	0 dny	15.9. 13	15.9. 13
18	Bourací práce	65 dny	9.9. 13	13.11. 13
19	Drenáže	4 dny	21.9. 13	25.9. 13
20	Zakládání	8 dny	13.9. 13	21.9. 13
21	Svislé konstrukce	75 dny	25.9. 13	9.12. 13
22	Vodorovné konstrukce část 1	95 dny	27.9. 13	31.12. 13
23	Závazný uzlový bod č.1 Dokončení realizace nových stropů nad 2NP (3034, 3035, 3036, 3037)	0 dny	31.12. 13	31.12. 13
24	Závazný uzlový bod č.3 Dokončení hrubých podlah v 1NP, 2NP	0 dny	31.12. 13	31.12. 13
25	Vodorovné konstrukce část 2	92 dny	31.12. 13	2.4. 14
26	Závazný uzlový bod č.4 Dokončení podlah v mezipodlaží 3NP, 4NP	0 dny	2.4. 14	2.4. 14
27	Závazný uzlový bod č.5 Dokončení stropu nad 3NP	0 dny	2.4. 14	2.4. 14
28	Páteřní rozvody vnitřních sítí	48 dny	13.11. 13	31.12. 13
29	Závazný uzlový bod č.2 Dokončení realizace páteřních rozvodů vnitřních sítí	0 dny	31.12. 13	31.12. 13
30	TZB	250 dny	31.12. 13	7.9. 14
31	Výtah	15 dny	2.4. 14	17.4. 14
32	Úpravy povrchů	260 dny	20.12. 13	6.9. 14
33	Nášlapné vrstvy podlah	91 dny	3.7. 14	2.10. 14
34	Truhlářská konstrukce	70 dny	7.8. 14	16.10. 14
35	Zámečnické konstrukce	70 dny	7.8. 14	16.10. 14
36	Malby	53 dny	6.9. 14	29.10. 14
37	Dokončovací a úklidové práce	17 dny	29.10. 14	15.11. 14
38	**Most**	**425 dny**	**9.8. 13**	**8.11. 14**
39	Dřevěné bednění	20 dny	9.9. 13	29.9. 13
40	Sejmutí povrchu	5 dny	29.9. 13	4.10. 13
41	Sanace mostu	390 dny	4.10. 13	29.10. 14
42	Závazný uzlový bod č.9 Dokončení sanace mostu do zahrady	0 dny	29.10. 14	29.10. 14
43	Nový povrch vozovky	10 dny	29.10. 14	8.11. 14
44	**IO 01 Venkovní kanalizace, vodovod**	**45 dny**	**24.9. 13**	**8.11. 13**
45	Venkovní kanalizace, vodovod	45 dny	24.9. 13	8.11. 13
46	**IO 02 Plynovodní přípojka**	**45 dny**	**24.9. 13**	**8.11. 13**
47	Plynovodní přípojka	45 dny	24.9. 13	8.11. 13
48	**PS 01 Vnitřní mobiliář**	**18 dny**	**28.10. 14**	**15.11. 14**
49	Vnitřní mobiliář	18 dny	28.10. 14	15.11. 14
50				
51	**Zahrada**			
52	Přípravné práce	412 dny	4.9. 13	21.10. 14
53	**SO 01 Vstupní brána**	75 dny	4.9. 13	18.11. 13
54	Vstupní brána	170 dny	14.3. 14	31.8. 14
55	**SO 02-SO 04 Infokiosek, krytá scéna, zázemí**	170 dny	14.3. 14	31.8. 14
56	Infokiosek, krytá scéna, zázemí	286 dny	18.11. 13	31.8. 14
57	**SO 05 Kuželník**	286 dny	18.11. 13	31.8. 14
58	Kuželník	230 dny	23.11. 13	11.7. 14
59	**SO 06 Vodárenská věž**	230 dny	23.11. 13	11.7. 14
60	Vodárenská věž	233 dny	20.11. 13	11.7. 14
61	**SO 07 Sklenik**	233 dny	20.11. 13	11.7. 14
62	Sklenik	234 dny	19.11. 13	11.7. 14
63	**SO 08 Centrální dům**	234 dny	19.11. 13	11.7. 14
64	Centrální dům	231 dny	22.11. 13	11.7. 14
65	**SO 09 Zahradní altán**	231 dny	22.11. 13	11.7. 14
66	Zahradní altán	162 dny	7.12. 13	18.5. 14
67	**SO 10 Zděná kůlna**	162 dny	7.12. 13	18.5. 14
68	Zděná kůlna	76 dny	18.3. 14	2.6. 14
69	**SO 11 Dům správce**	76 dny	18.3. 14	2.6. 14
70	Dům správce	171 dny	13.3. 14	31.8. 14
71	**SO 15_35_36 Vodohospodářské objekty**	171 dny	13.3. 14	31.8. 14
72	Vodohospodářské objekty	253 dny	19.9. 13	30.5. 14
73	**SO 19 - SO 29 Objekty venkovních ploch**	253 dny	19.9. 13	30.5. 14
74	Objekty venkovních ploch	205 dny	26.2. 14	19.9. 14
75	**SO 30 Sadové úpravy**	205 dny	26.2. 14	19.9. 14
76	Sadové úpravy	40 dny	20.8. 14	28.9. 14
77	**Areálové rozvody**	40 dny	20.8. 14	29.9. 14
78	Areálové rovody	295 dny	19.9. 13	11.7. 14
79	Závazný uzlový bod č.7 Dokončení stavebních prací v zahradě	295 dny	19.9. 13	11.7. 14
80	Úklidové práce	0 dny	29.9. 14	29.9. 14
81	**Dokončení a předání díla**	22 dny	29.9. 14	21.10. 14
82	Předpřejímka	15 dny	13.11. 14	30.11. 14
83	Odstranění vad z předpřejímky	2 dny	15.11. 14	17.11. 14
84	Přejímka	12 dny	17.11. 14	29.11. 14
85	Předání stavby/díla investorovi	1 den	29.11. 14	30.11. 14
		0 dny	30.11. 14	30.11. 14

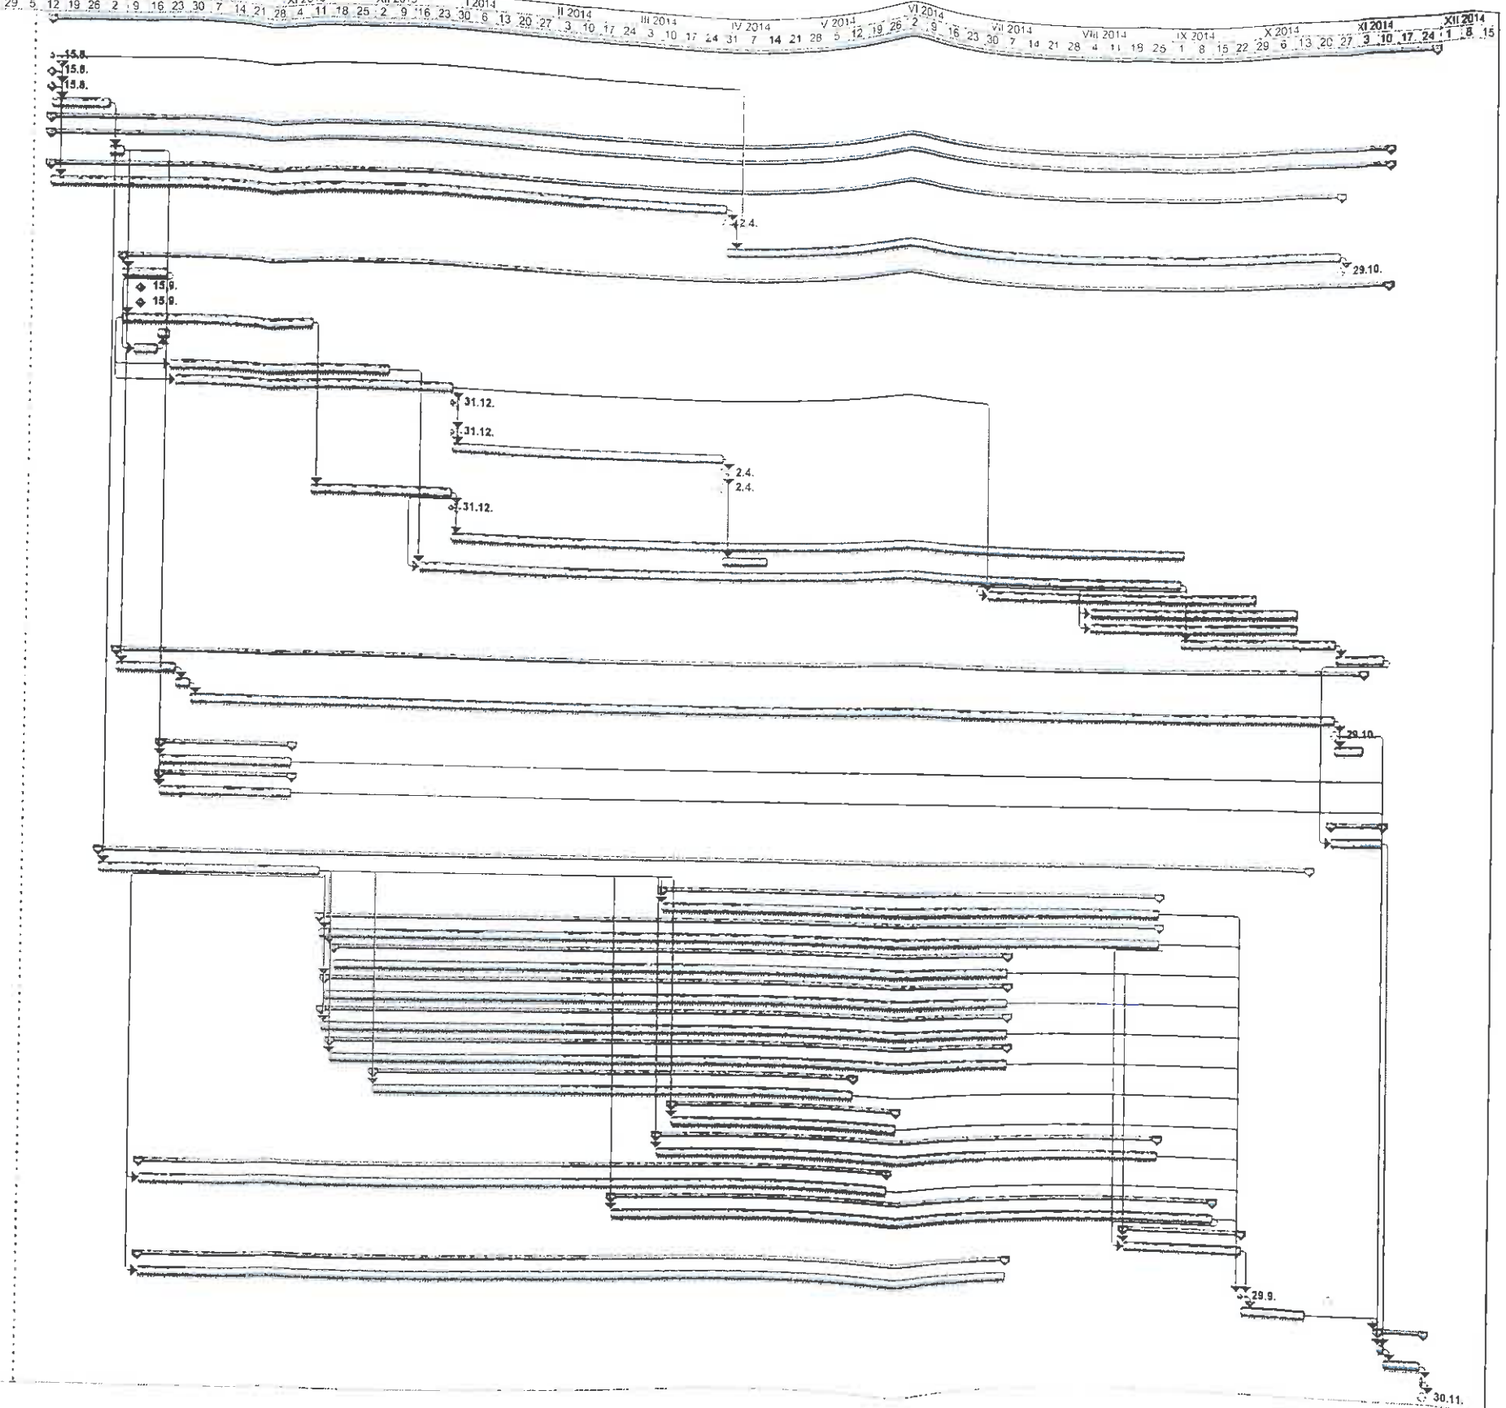

Projekt: Klášter Broumov
Datum: 9.8.13

Úkol | Rozdělení | Průběh | Milník | Souhrny | Souhrn projektu | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín
